
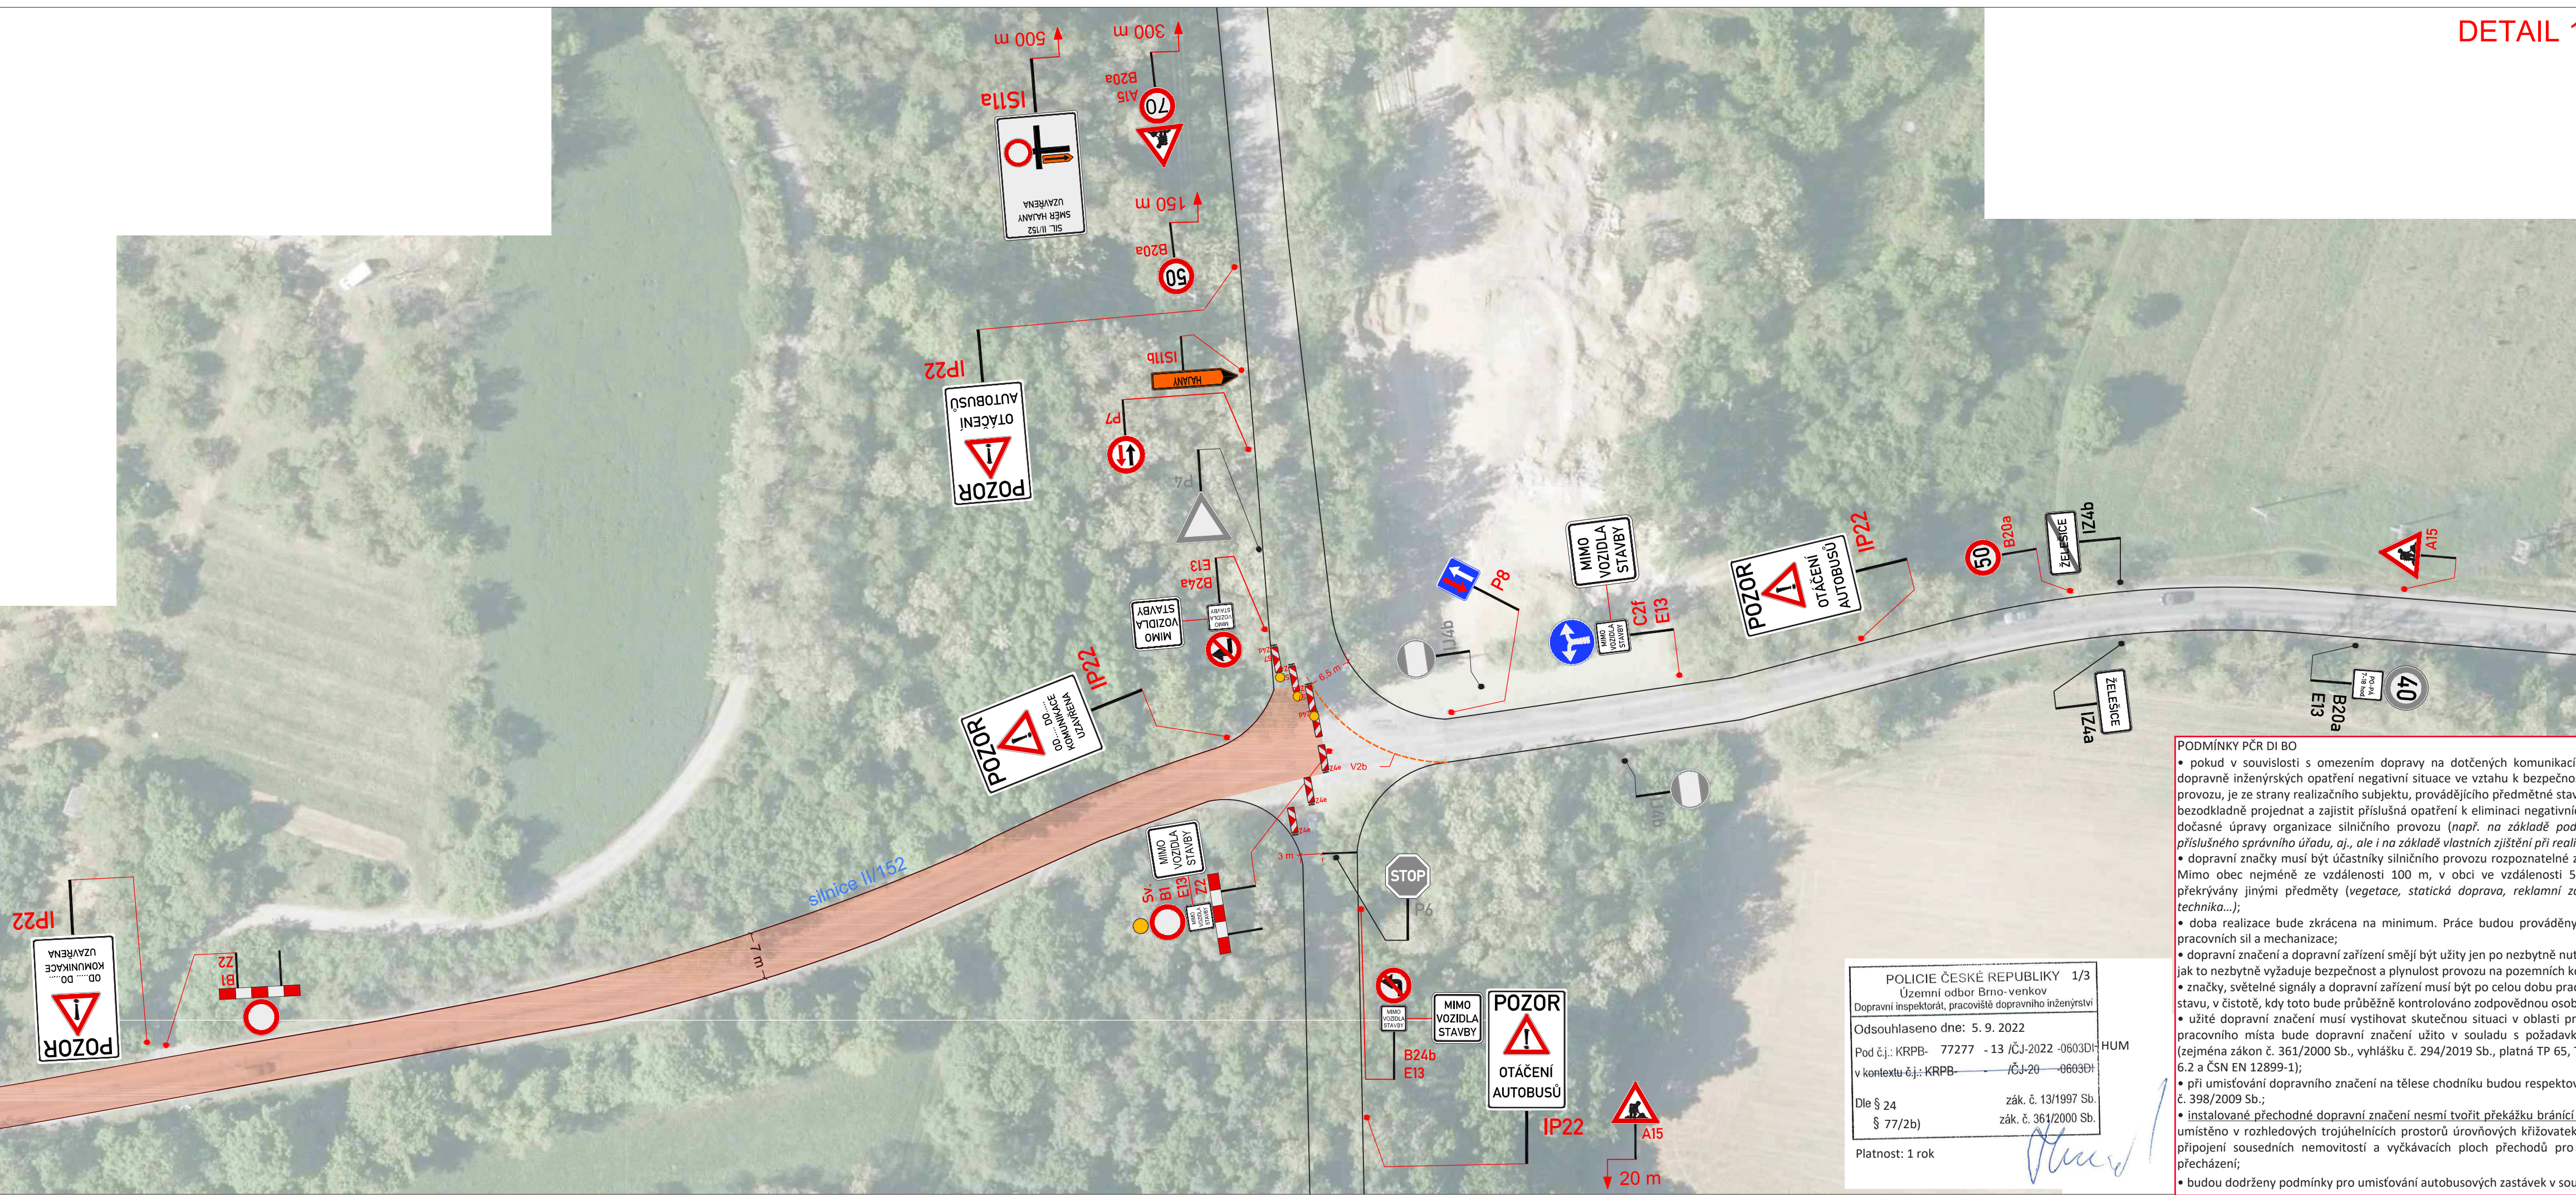
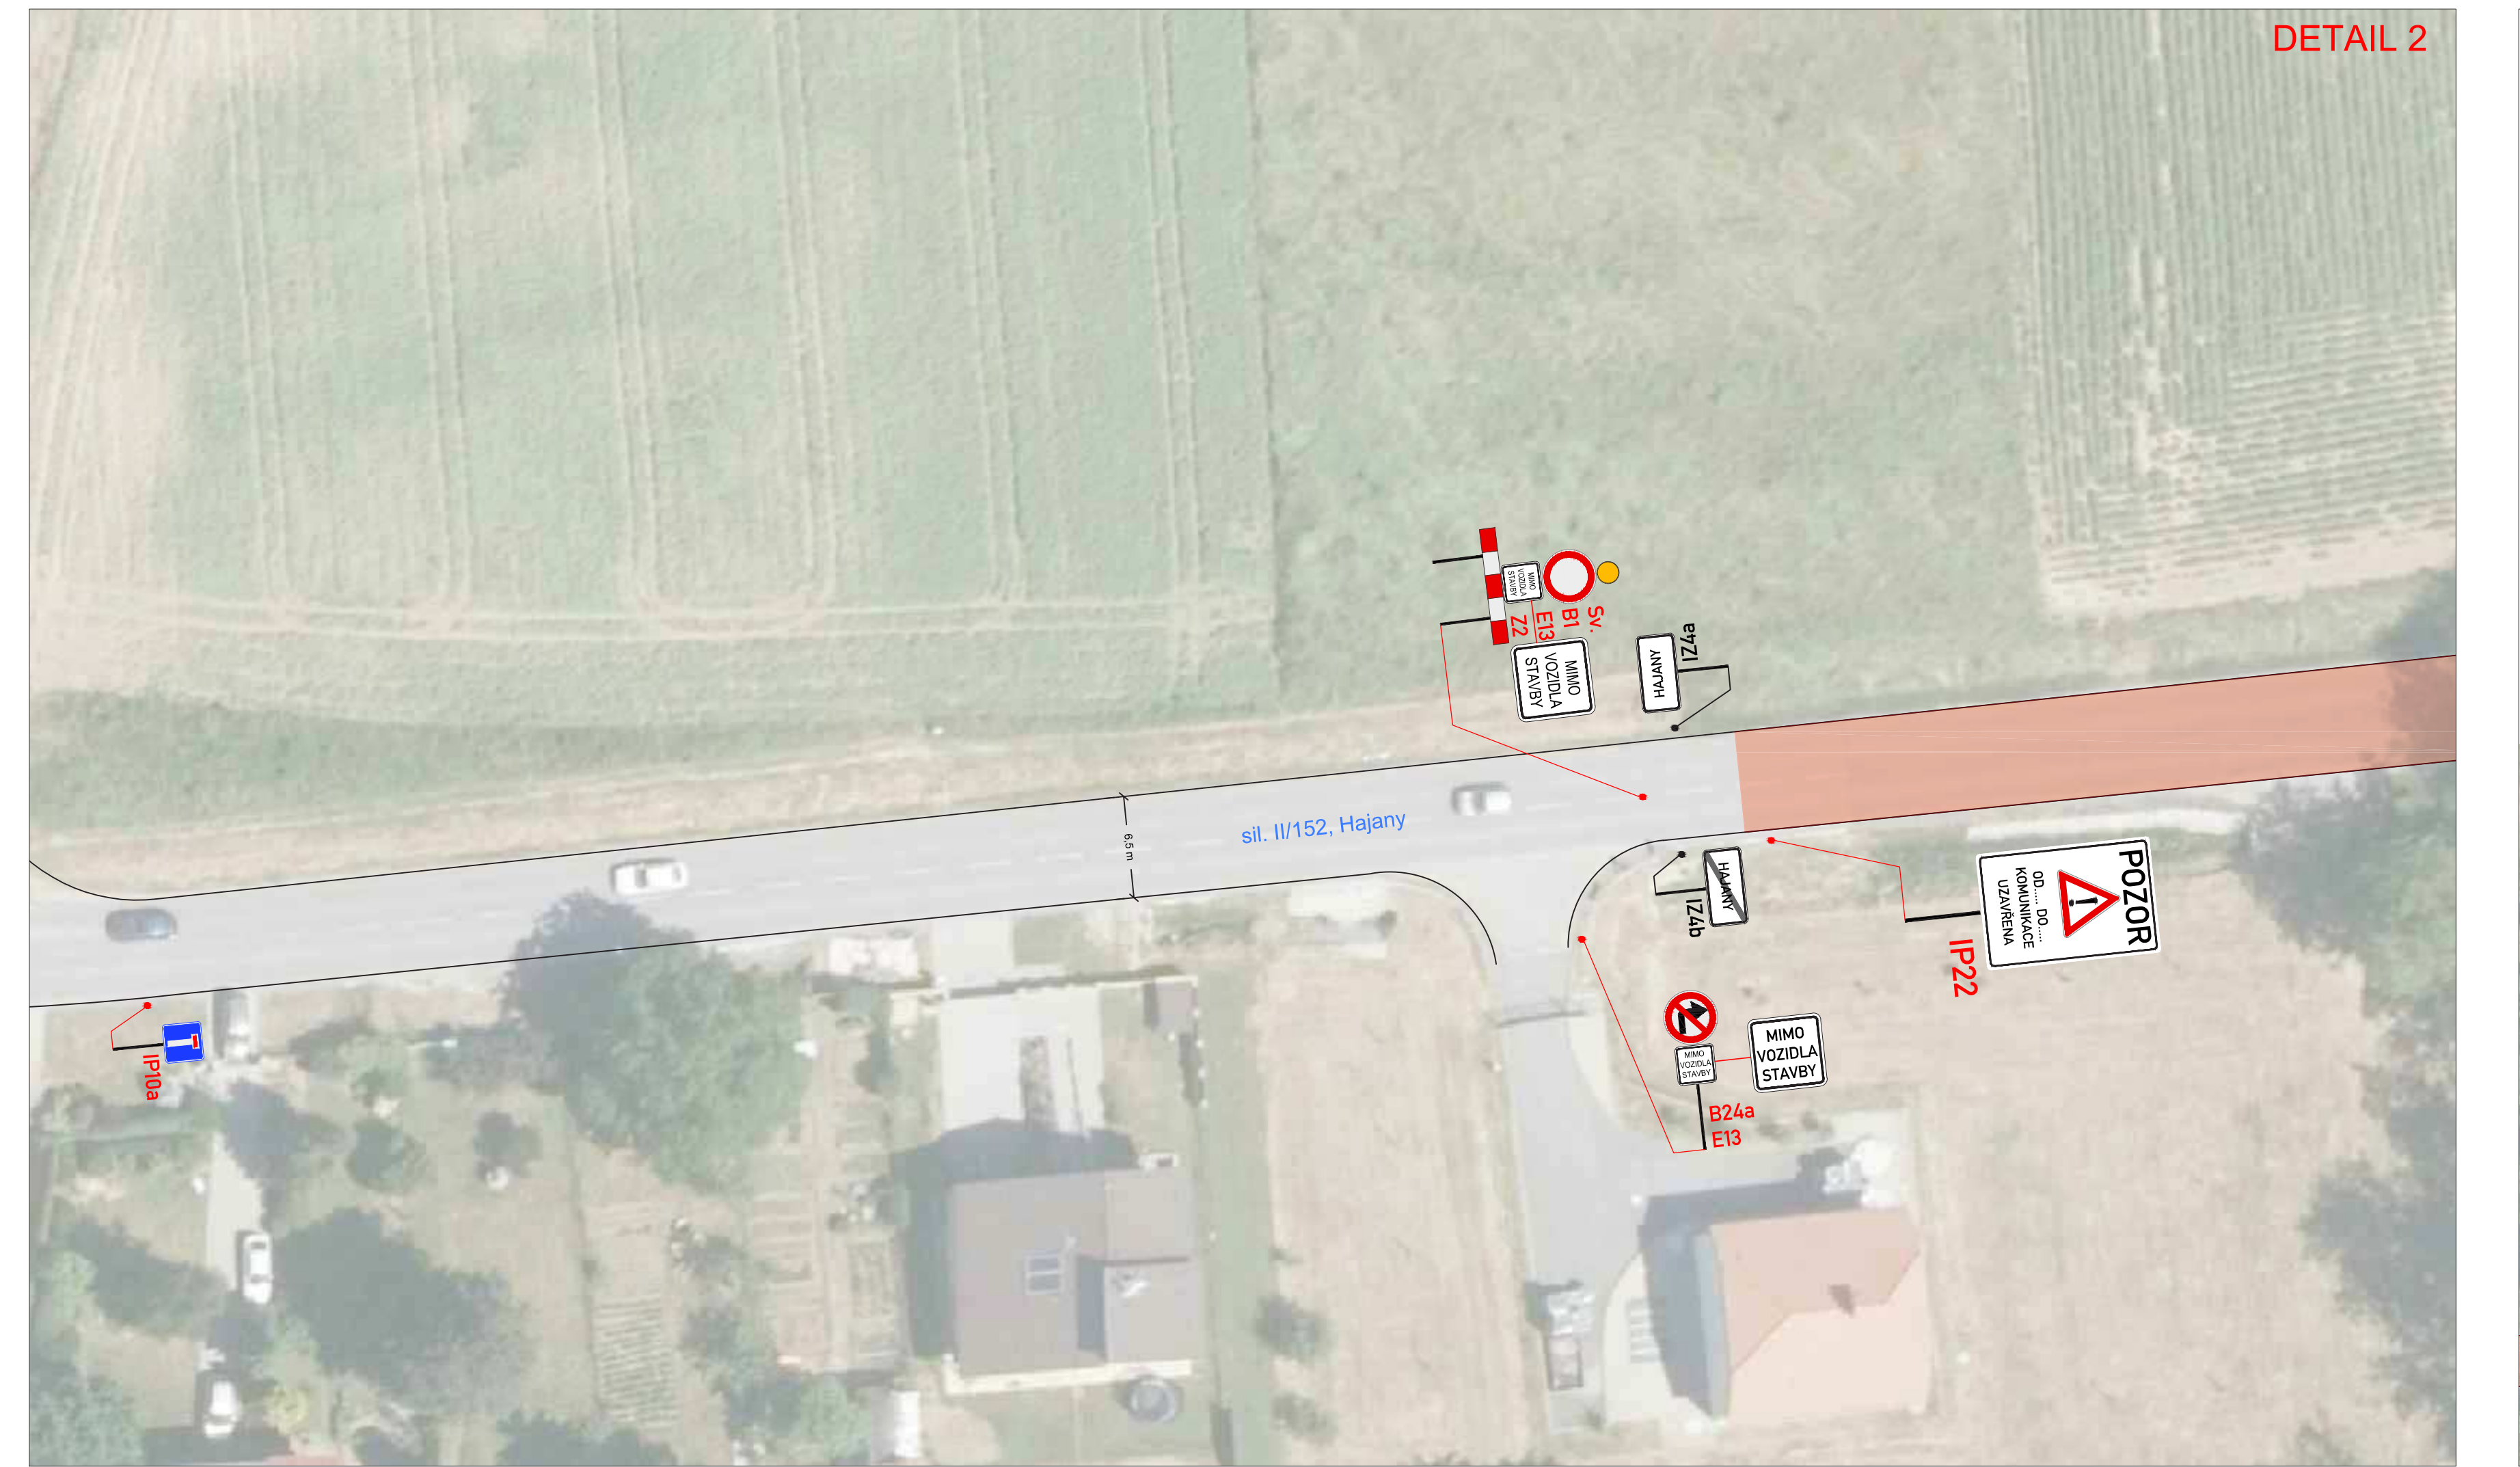


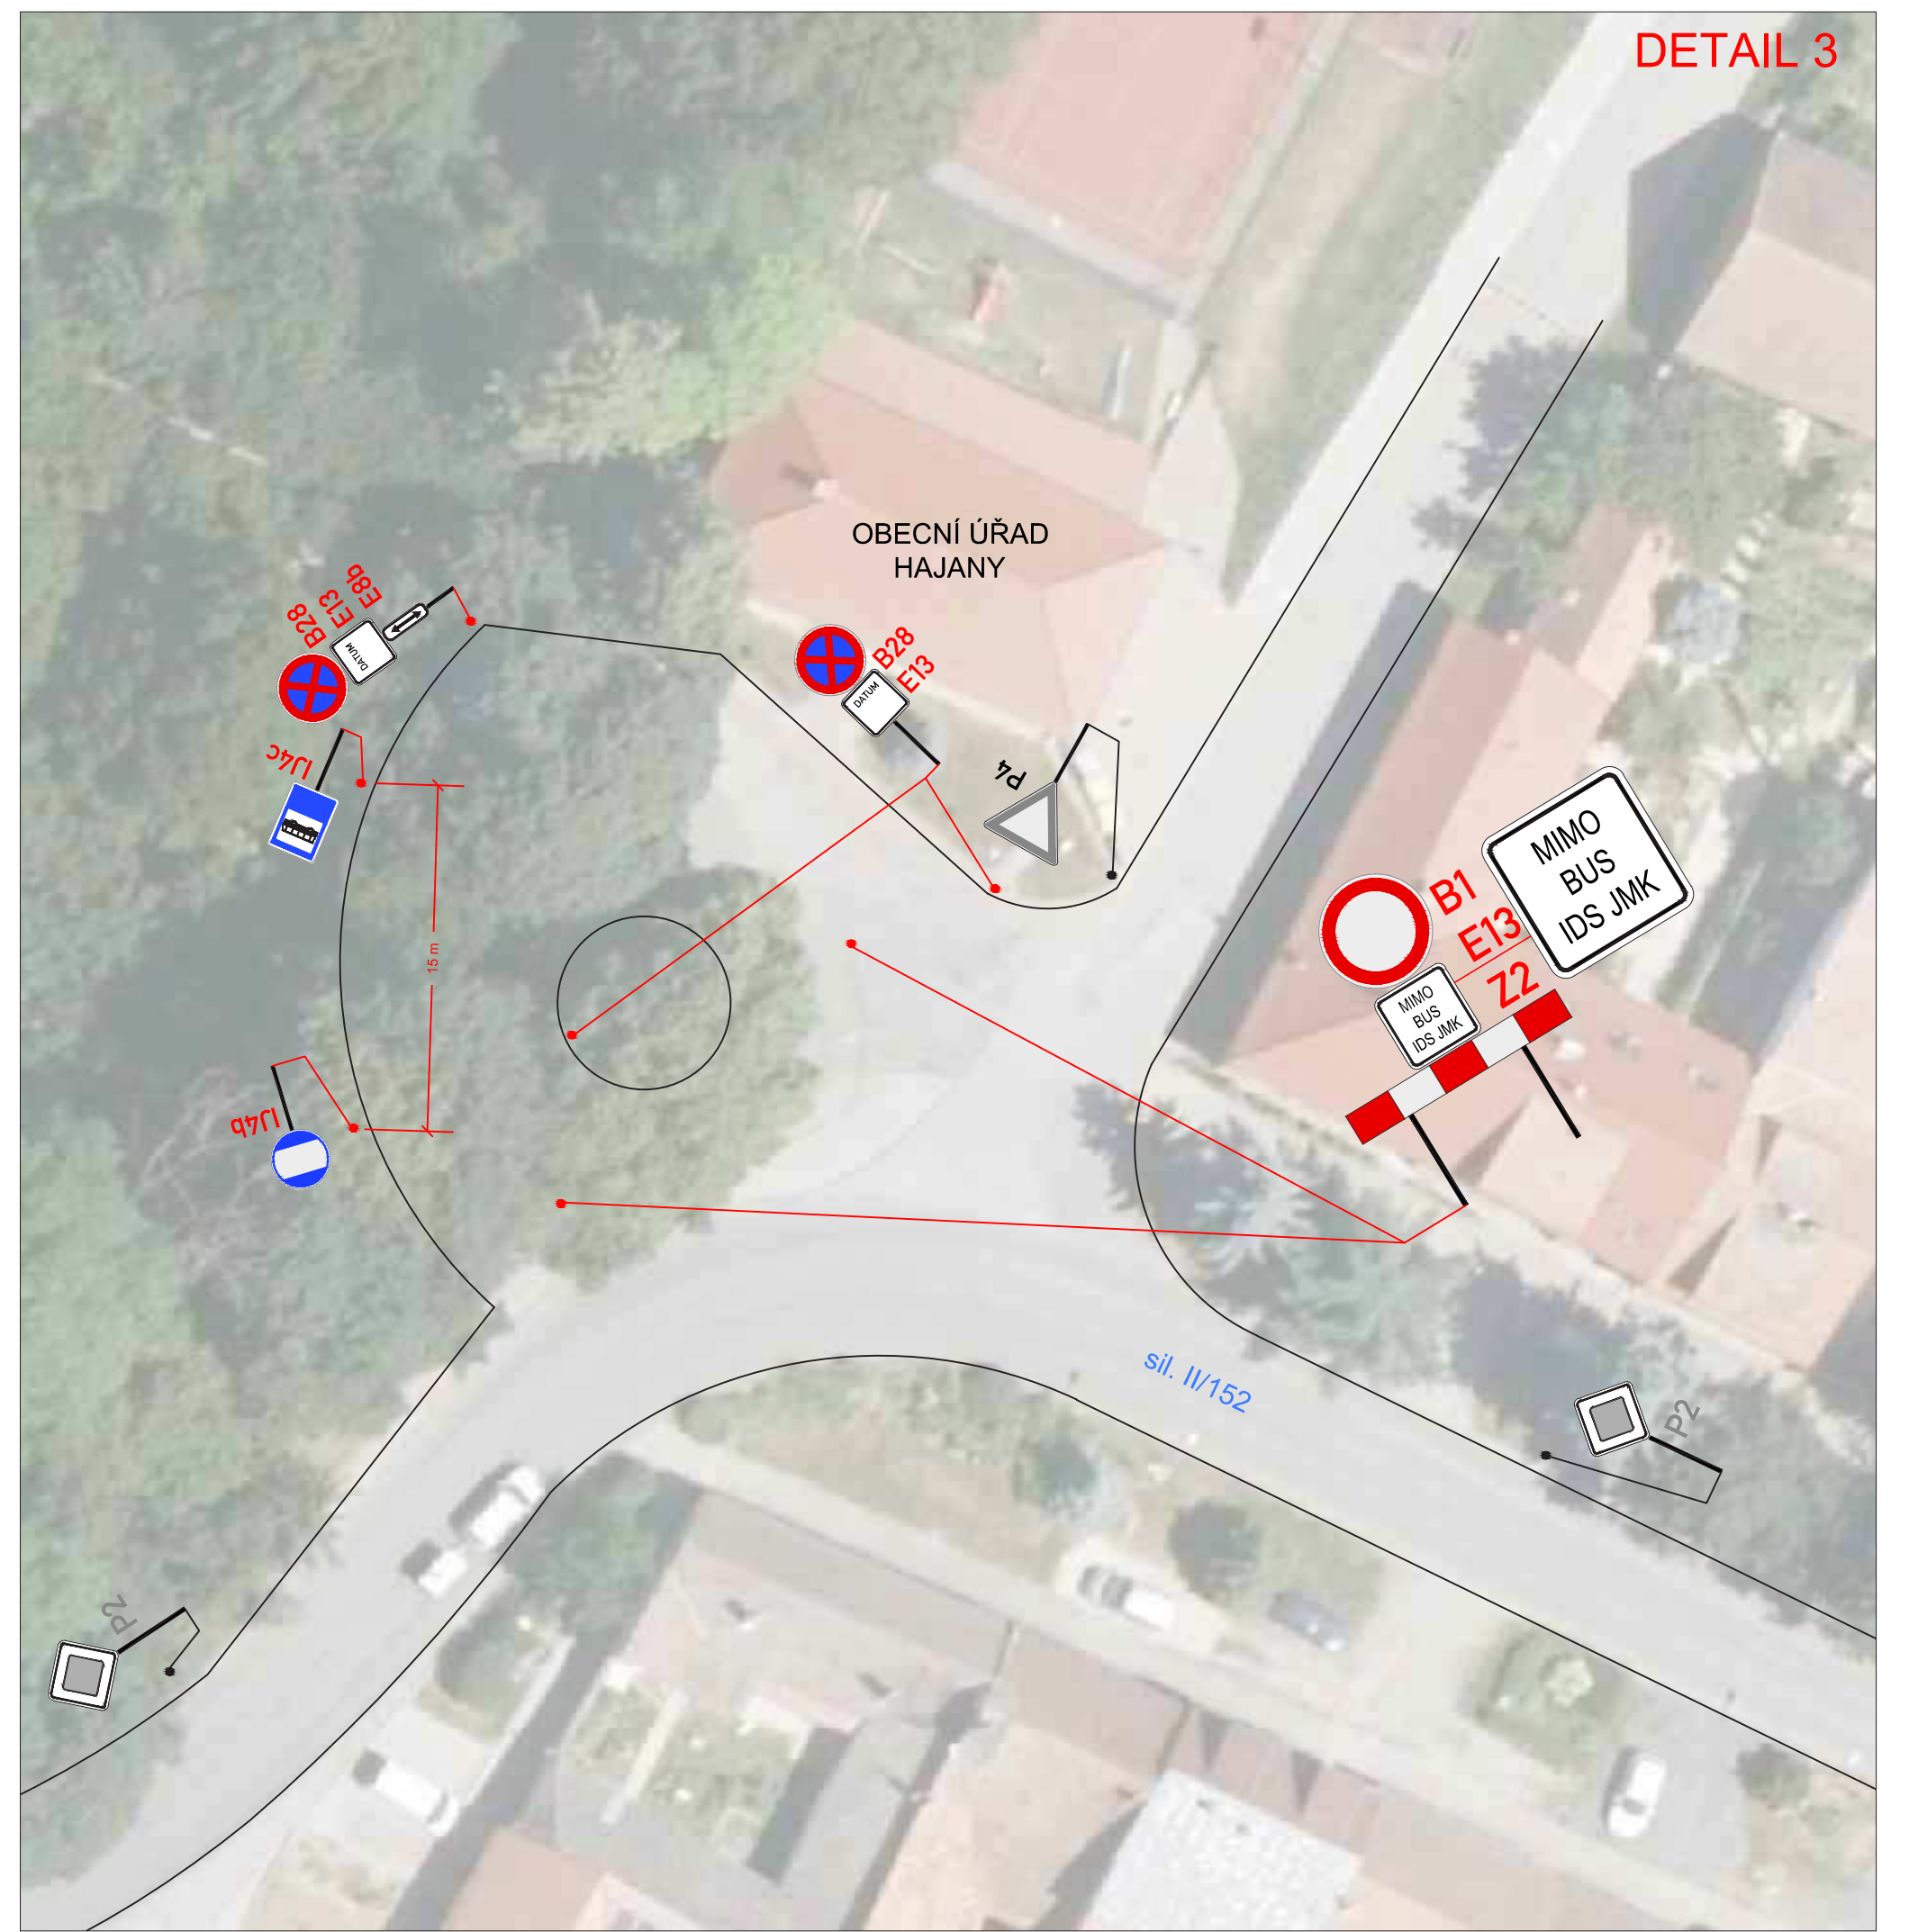

LEGENDA:

- PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZRUŠENÉ
- PRACOVNÍ MÍSTO

POZNÁMKA:
- Umístění přechodného dopravního značení dle TP č. 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)
- Přechodné DZ B28 bude osazeno 7 dní před začátkem stavby a v den stavby odstraněno.


PŘEHLEDOVÁ MAPA/ŠIRŠÍ VZTAHY:

ETAPA 3 - UZAVÍRKA

Podmínky PCR DI BO

- pokud v souvislosti s omezením dopravy na dotčených komunikacích nastane v důsledku dopravně inženýrských opatření negativní situace ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, je ze strany realizátora subjektu, provádějícího předmětné stavební činnosti, povinností bezodkladně projednat a zajistit příslušná opatření k eliminaci negativních následků plynoucích z dočasné úpravy organizace silničního provozu (např. na základě podmínek police ČR, místně příslušného správního úřadu, aj., ale i na základě vlastních zjištění při realizaci stavebních prací);
- dopravní značky musí být účastníky silničního provozu rozpoznatelné z dostatečné vzdálenosti. Mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m, v obci ve vzdálenosti 50 m. Značky nesmí být překrývány jinými předměty (vegetace, statická doprava, reklamní zařízení, sloupky, pracovní technika...);
- doba realizace bude zkrácena na minimum. Práce budou prováděny s maximálním využitím pracovních sil a mechanizace;
- dopravní značení a dopravní zařízení smí být použity jen po nezbytné nutnou dobu a jen z důvodu jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích;
- značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě, kdy toto bude průběžně kontrolováno zodpovědnou osobou;
- užití dopravního značení musí vyhovovat skutečné situaci v oblasti pracovního místa. V rámci pracovního místa bude dopravní značení uloženo v souladu s požadavky souvisejících předpisů (zejména zákon č. 361/2000 Sb., vyhlášku č. 294/2019 Sb., platná TP 65, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a ČSN EN 12899-1);
- při umísťování dopravního značení na tělese chodníku budou respektována ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb.;
- instalované přechodné dopravní značení nesmí tvořit překážku bránící v rozhledu, tj. nesmí být umístěno v rozhledových trojúhelníkových prostorů úrovněových klízkovek pozemních komunikací, připojení sousedních nemovitostí a vyčkávacích ploch přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení;
- budou dodrženy podmínky pro umísťování autobusových zastávek v souladu s ČSN 73 6425-1.

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY 1/3 Územní odbor Brno-venkov Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství Odsouhlaseno dne: 5. 9. 2022 Pod č.j.: KRPB- 77277 -13 (ČJ-2022-06030) HUM v kontextu č.j.: KRPB- 77277 -13 (ČJ-2022-06030) HUM Dle § 24 zák. č. 13/1997 Sb. § 77(2b) zák. č. 361/2000 Sb. Platnost: 1 rok		Zodpovědný projektant: Petr BEDNAR podpis: Reditel: Radek SUCHOMEL podpis: moh: 602 593 383 Technická kontrola: Petr BEDNAR podpis:		ZNAMOM ZNAMOM s.r.o., ZENGROVA 2694/4, 615 00 BRNO	
Místo:	HAJANY	Číslo zak.:	22Z00636		
Silnice:	II/152	Formát:	297x1610		
Staničení úseku:	—	Datum:	8/2022		
Akce:	II/152 HAJANY - ŽELEŠICE	Číslo přílohy:	1		
Obsah:	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				

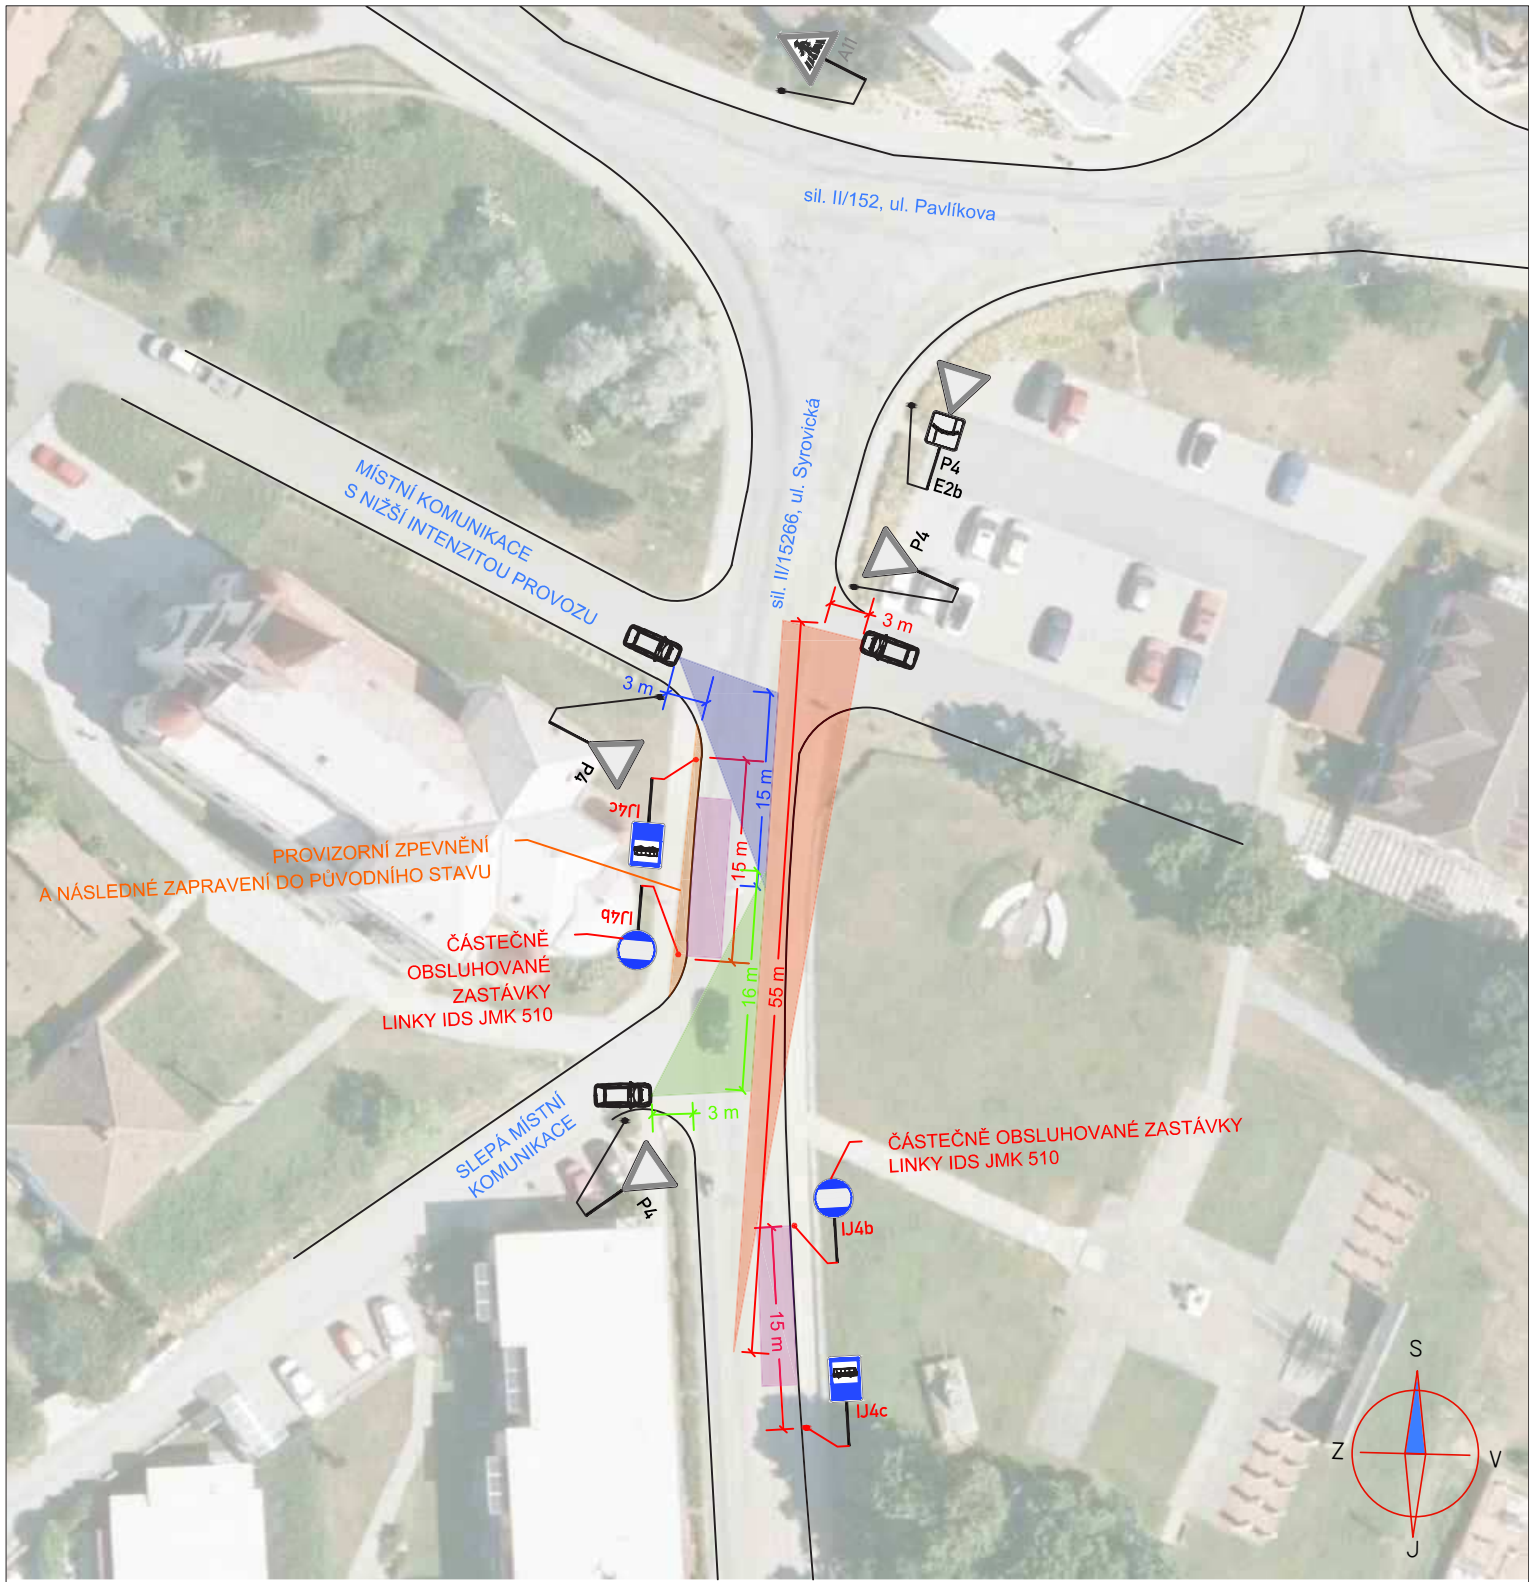

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 2/3
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát
pracoviště dopravního inženýrství
611 32 Brno, Kounicova 24
Č.j.: KRPB-77277-13/ČJ-2022-0603DI-HUM

LEGENDA:

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

IP4 STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZRUŠENÉ

ROZHLEDOVÝ TROJÚHELNÍK


ROZHLEDOVÝ TROJÚHELNÍK

ROZHLEDOVÝ TROJÚHELNÍK

AUTOBUS

POZNÁMKA:

- Umístění přechodného dopravního značení dle TP č.66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)

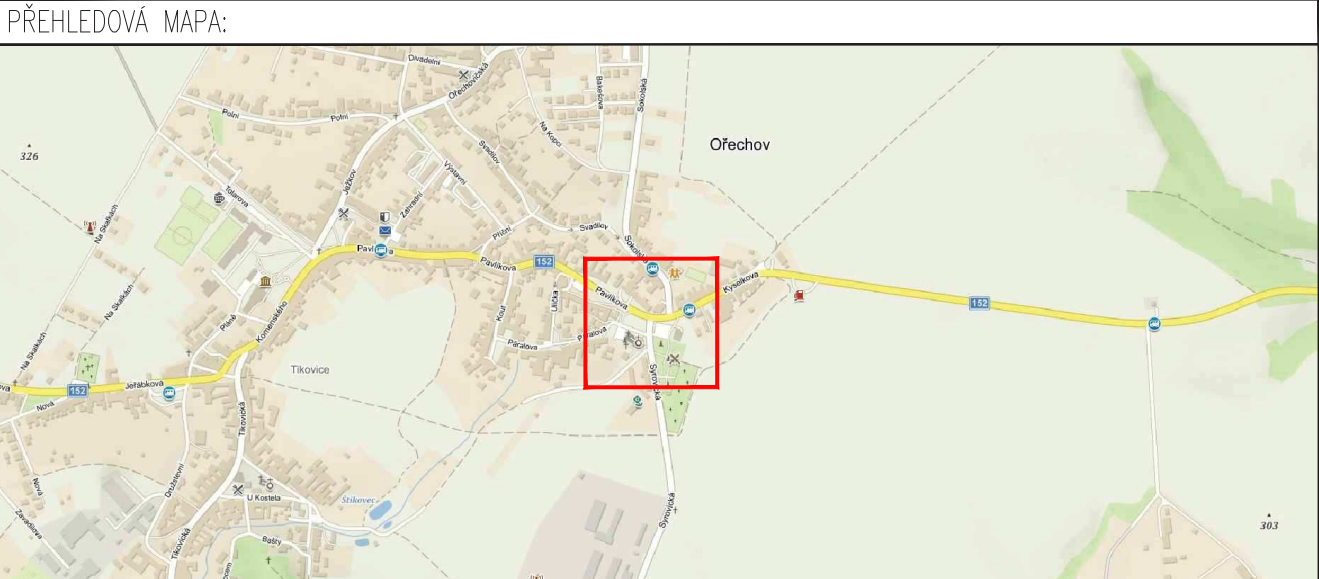


POZNÁMKA:

Zastávky v obci Ořechov na ul. Syrovická budou pro spoje jedoucí po odklonné trase a budou sloužit obyvatelům obce Ořechov i obcím po trase linky 510 ke spojení na zdravotní středisko. Zastávka u obecního úřadu je poměrně daleko a navíc je to do kopce. Četnost dopravy nepřesáhne 27 párů autobusů za den.

ETAPA 3 - DOPLNĚNÍ ZASTÁVKY

ZNAKOM s.r.o. – ZENGROVA 2694/4, 615 00 BRNO, TEL. 602 593 383, ZNAKOM@ZNAKOM.CZ, (PRACOVISTĚ: RYBNÍČEK 12, 602 00 BRNO)			
Vypracoval: Štěpán ŘEZNÍK podpis:	Zodpovědný projektant: Petr BEDNÁŘ podpis:	Ředitel: Radek SUCHOMEL mob: 602 593 383	 ZNAKOM s.r.o., ZENGROVA 2694/4, 615 00 BRNO
Technická kontrola: Petr BEDNÁŘ podpis:	Vedoucí projektant: Petr BEDNÁŘ podpis:		

Místo:	OŘECHOV, ul. PAVLÍKOVA, SYROVICKÁ	Číslo zak.:	22Z00636
Silnice:	II/152; III/15266	Formát:	A3
Staničení úseku:	–	Datum:	8/2022
Akce:	II/152 HAJANY - ŽELEŠICE	Číslo přílohy: 2	
Obsah:	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		

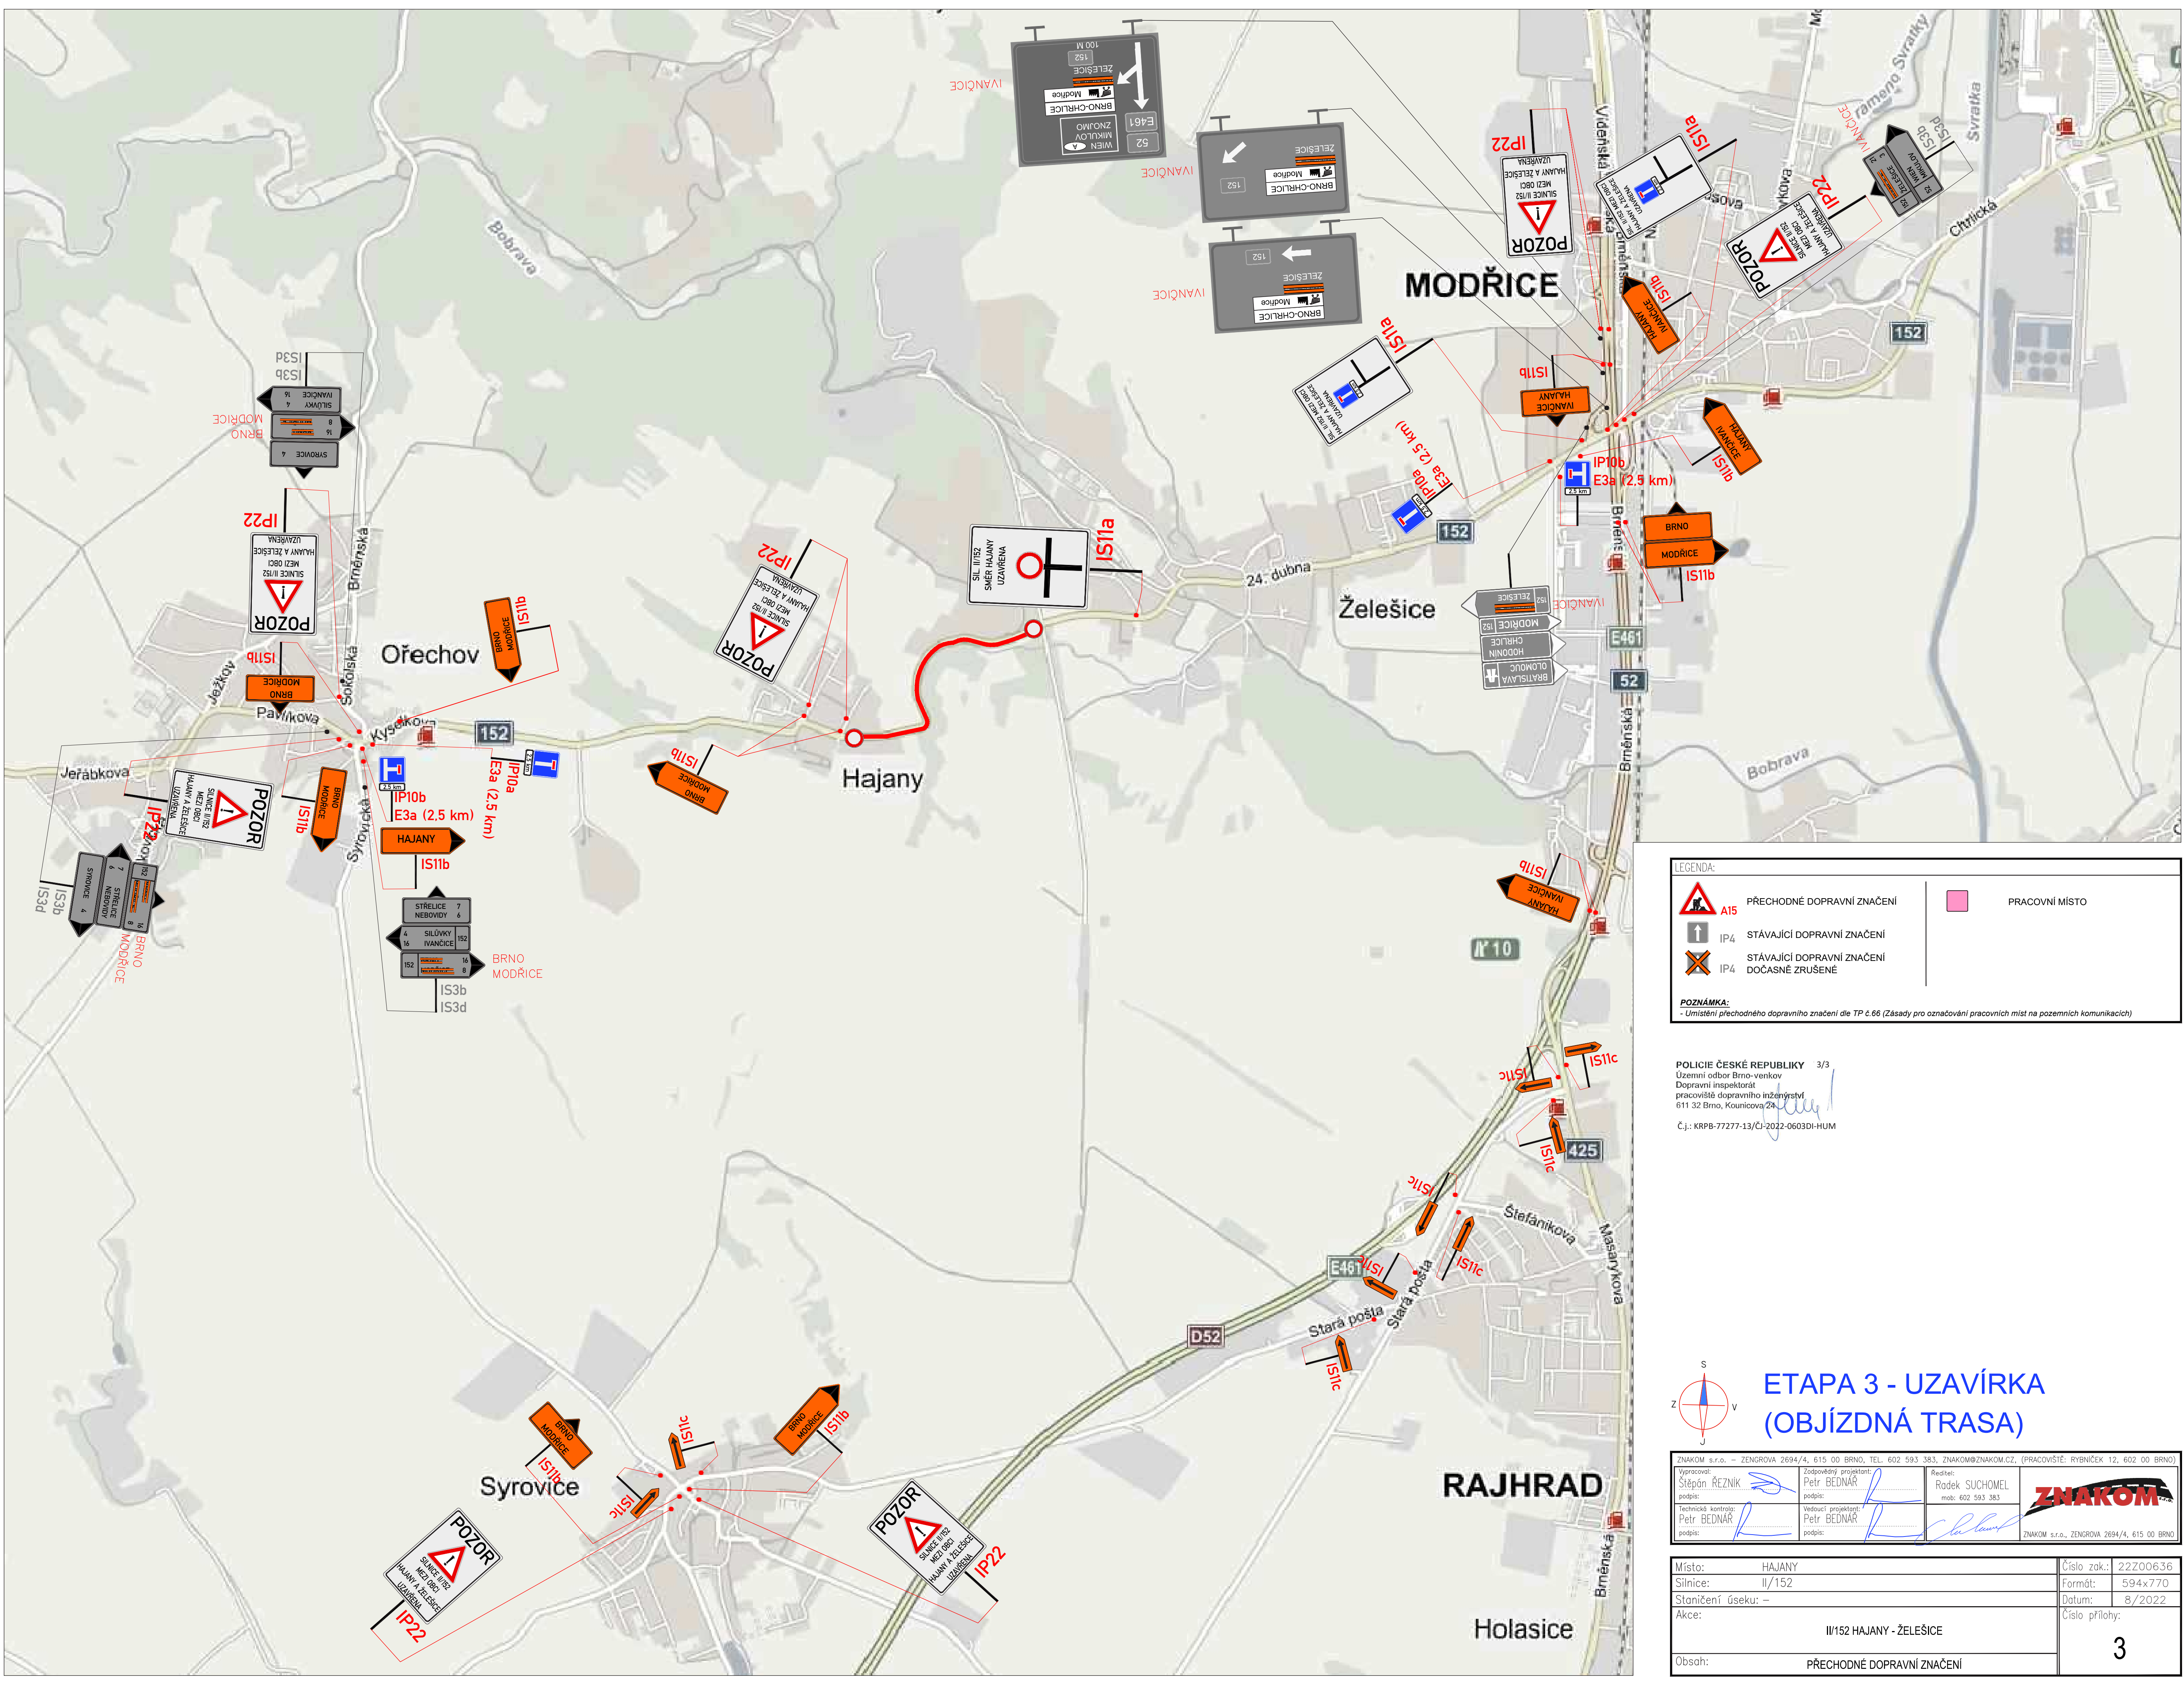

LEGENDA:

A15 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

IP4 STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

IP4 STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ DOČASNĚ ZRUŠENÉ

PRACOVNÍ MÍSTO

POZNÁMKA:
- Umístění přechodného dopravního značení dle TP č. 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 3/3
Územní odbor Brno-venkov
Dopravní inspektorát
pracoviště dopravního inženýrství
611 32 Brno, Kounicova 23.
Č.j.: KRPB-77277-13/CJ-2022-0603DI-HUM

ETAPA 3 - UZAVÍRKA (OBJÍZDNÁ TRASA)

ZNAKOM s.r.o. – ZENGROVA 2694/4, 615 00 BRNO, TEL. 602 593 383, ZNAKOM@ZNAKOM.CZ, (PRACOVNÍSTE: RYBNÍČEK 12, 602 00 BRNO)		
Vypracoval: Stěpán REZNIK podpis:	Zodpovědný projektant: Petr BEDNAR podpis:	Reditel: Radek SUCHOMEL mob: 602 593 383
Technická kontrola: Petr BEDNAR podpis:	Vedoucí projektant: Petr BEDNAR podpis:	

Místo:	HAJANY	Číslo zak.:	22Z00636
Silnice:	II/152	Formát:	594x770
Staničení úseku:	–	Datum:	8/2022
Ákce:	II/152 HAJANY - ŽELEŠICE	Číslo přílohy:	3
Obsah:	PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		
